


揭阳大南海石化工业区雨水明渠一期工程临时用地土地复垦竣工图

复垦工程量统计			
序号	工程内容	竣工工程量	备注
1	临时用地复垦区面积 (公顷)	1.9115	
2	复垦后林地面积 (公顷)	1.9115	
3	土地平整工程	拆除砼硬化地面(m²)	2200.53
		清理碎石质垫层(m²)	1389.87
		拆除砌体及围墙(m²)	503.30
		石渣土及建筑垃圾外运(m³)	4093.70
4	土壤改良工程	施有机肥(kg)	5734.50
		土地翻耕(mm²)	1.9115
		定植时每株添加复合肥(kg)	611.80
5	植被重建工程	种植木麻黄(棵)	3059.00
		株距2.5m, 行距2.5m	
		播撒草籽(kg)	382.30
6	配套设施工程	新修土沟	57.23
		PVC管-1(m)	448.70
		PVC管-2(m)	26.90
		直径20mm	直径200mm

		复垦前		复垦后		增减	
一级地类	二级地类	面积	比例	面积	比例	面积	比例
林地	有林地	3.9281	69.05	1.9115	100.00	-2.0166	30.95
草地	其他草地	1.7608	30.95	0.0000	0.00	-1.7608	-30.95
合计		5.6889	100.00	1.9115	100.00	-3.7774	0.00

经套合土地决策系统已批红线，项目复垦范围5.6889公顷用地已依法办理农转用手续的面积为3.7774公顷。根据广东省自然资源厅《广东省自然资源厅关于进一步严格规范临时用地管理的通知》（粤自然资规〔2020〕1号）的有关规定：“临时用地批准在临时使用期满后未经批准擅自将合法建设用地的，合法建设用地的批准使用期限，临时用地可不行有关批复规定。已依法办理农转用手续的面积为3.7774公顷不纳入本次复垦范围，本次复垦范围面积为1.913公顷。

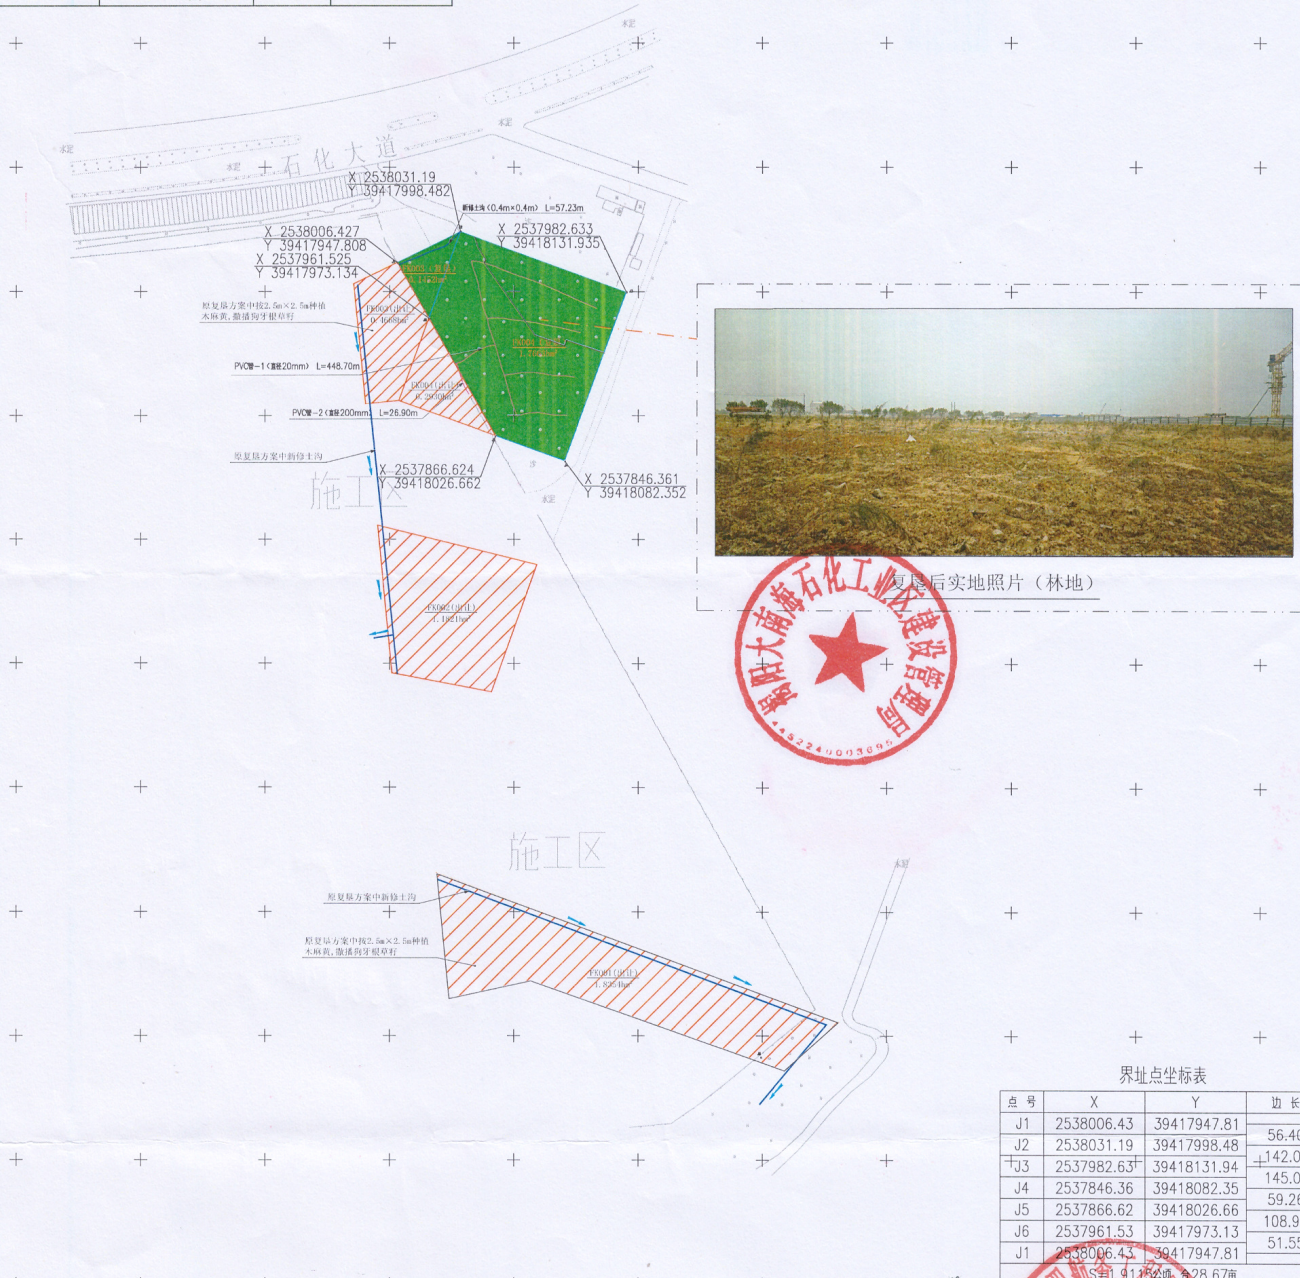

点号	X	Y	边长
J1	2538006.43	39417947.81	
J2	2538031.19	39417998.48	56.40
J3	2537982.63	39418131.94	+142.01
J4	2537846.36	39418082.35	145.01
J5	2537866.62	39418026.66	59.26
J6	2537961.53	39417973.13	108.96
J7	2538060.43	39417947.81	51.55

揭阳大南海石化工业区雨水明渠
一期工程临时用地土地复垦项目

施工单位	中交第四航务工程局有限公司揭阳大南海石化工业区雨水明渠二期工程项目经理部		
测绘员	李松筠	绘图员	许安涛
检查员	李松筠	制图日期	2024年5月

说明:

- 1.土地使用时，做好土地管护措施，防止水土流失和扩大土地损毁范围；
- 2.利用有机肥改良土壤，按3000kg/公顷；土地翻耕2次；
- 3.新增抽水井和PVC管，形成良好的灌溉条件；
- 4.林地播撒狗牙根草籽是土地迅速复绿，种植株距2.5m，行距2.5m，直径1.0cm以上、高度50cm以上的木麻黄树苗；
- 5.实行三年管护，管护期间林地措施主要是适时施肥促进树木生长。

图例

项目区范围线	
出让范围	
复垦为林地	
PVC管	
原复垦方案中新修土沟	
